


Kirkes-kirjastojen järjestelmänvaihto Aurorasta Kohaan

ja mitä toimenpiteitä se vaati Kirkes-Finnassa



Järvenpää

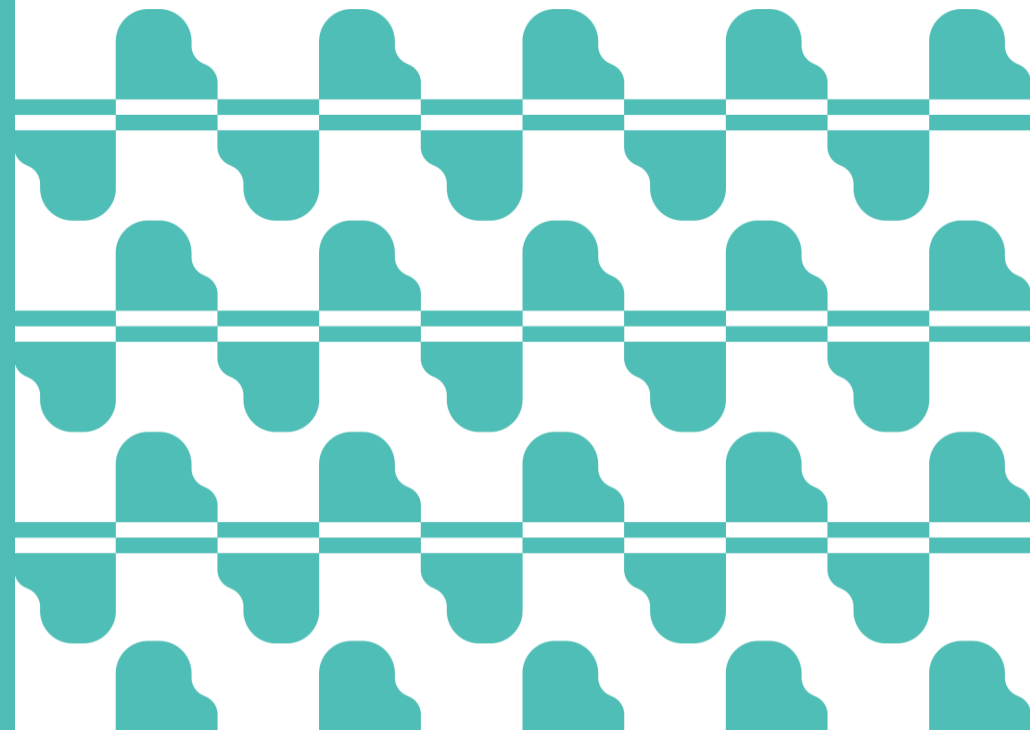

Kirkesein Koha-projekti

- Polkaistiin käyntiin elokuussa 2022. Projektia luotsasi täysipäiväinen projektipäällikkö 1.9.2022-31.10.2023.
- Sekä Koha-Suomella että Kansalliskirjastossa oli aiempaa kokemusta Vaskin Aurora-Koha-konversiosta, joten projekti eteni molempien kanssa hyvin sujuvasti.
- Uusi järjestelmä saatiin tuotantokäyttöön ja kirjastot avattiin 12.9.2023, reilu vuosi aloituspalaverin jälkeen.

*Projektia luotsasi
täysipäiväinen
projektipäällikkö
1.9.2022-31.10.2023.*

Miten Finnan kanssa edettiin

- Tavoitteena oli alusta asti, että bibliografisten tietueiden ID:t ja sisältö säilyisivät ennallaan (samoin kuin kirjastokortilla kirjautuminenkin). Haluttiin että Finnan käyttäjäkokemus muuttuisi mahdollisimman vähän.
- Axiellilta saatiin ensimmäinen dumppi loppuvuodesta 2022. Dumpissa oli kuitenkin kuvailutietueet epäjärjestyksessä, joten hetken aikaa näytti siltä, että asiakkaiden suosikkilistat ja tallennetut haut eivät säilyisi konversiossa. Lisäksi tietueiden ID-numeroiden vaihtumisella olisi ollut vaikutusta kirjanmerkkeihin, hakukoneiden indekseihin jne.
- Koha-Suomessa kirjoitettiin erillinen ohjelma kuvailutietueiden järjestämiseen, mutta loppujen lopuksi sitä ei tarvittu, koska dumpeissa numero kaksi ja kolme tietueet olivat järjestyksessä.

Tunteamaton tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC



Testaamisvaihe

- Kun ensimmäinen konversio Kohan testiympäristöön oli tehty, pyysimme Finna-postista siihen kytketyn testi-Finnan.
- Alkuvaiheessa testattiin ja tutkittiin perusasioita; että aineistot olivat konvertoituneet oikeisiin kirjastoihin ja oikeille hyllypaikoille ja, että niteet ovat oikeilla tietueilla ja kiinni oikeissa lainoissa, että oikeat lainat ovat kiinni oikeissa asiakkaissa ja että varaukset ovat kiinni oikeissa tietueissa jne.
- Finnan puolella tarkistettiin saatavuustietoja, uusimista, varaamista, asiakastietojen päivittämistä. Käytännössä siis tiedon kulkua Finnasta Kohaan ja Kohasta Finnaan.
- Oikeastaan kaikki perustoiminnot toimivat alusta asti. Finna työllisti meidän projektiryhmää loppujen lopuksi aika vähän.
- Koska tuotanto- ja testipuolen asiakasrekisterit ovat erillisissä järjestelmissä, suosikkilistoja ei vielä testi-Finnassa päässyt tutkimaan.

Sulkuaika

- Kirkes-kirjastot olivat kiinni 31.8.-11.9.
- Koska kuljetettavana-tila ei siirry Aurorasta Kohaan, kuljetukset keskeytettiin ja varaaminen estettiin jo 26.8. alkaen.



The screenshot shows the Kirkes website header with the logo and navigation icons. Below the header, a yellow banner contains the following text:

Kirkes-kirjastot ja verkkokirjasto ovat kiinni 31.8.-11.9.2023 järjestelmävaihdon takia. Saat lisätietoja oman kirjastosi verkkosivuilta.

Järjestelmä ei ole saatavissa

Järjestelmä ei ole käytettävissä käyttökätkön vuoksi. Tarkista myöhemmin uudelleen.

Saadaksesi apua ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun kirjasto@kirkes.fi

- Sulun alkaessa Finnaan kirjautuminen kytkettiin pois päältä. Lisäksi päädyimme piilottamaan oletusnäkyvän.
- Näkymän saatavuustietoineen olisi voinut myös jättää päälle sulun ajaksi ja vaihtaa oletusnäkyvää ns. lennossa.
- Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että viestinnällisesti on helpompaa laittaa kaikki kirjastojen ja verkkokirjaston toiminnot katkolle.
- Verkkokirjasto avattiin aamulla 12.9. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä

Mitä kaikkea meidän piti tehdä

- Finnaa ja verkkomaksamista varten teimme itse API-tunnukset ja –avaimet sekä testi-Kohaan että tuotanto-Kohaan ja toimitimme ne turvapostina Kansalliskirjastolle.
- Tuotantokäyttöönottovaiheessa teimme kopion oletusnäkyvästä ja pyysimme sen kytkemistä Kirkesin tuotanto-Kohaan.
- Finna-toimistosta pyysimme verkkomaksamisen ja salasanan palautustoiminnon päälle laittamista ja testasimme niiden toimivuutta ensin finna-pre:n puolella.
- Pyysimme myös että asiakkaan päivittäessä puhelinnumeroaan tieto päivittyy kenttiin *mobile* ja *sms_number*. Koha tarvitsee tiedon molempiin kenttiin.
- Toimipisteiden ja kohderyhmäfasetin (meillä käytössä hyllypaikan mukaan määräytyvät kohderyhmät) mappauksaulukoissa oli päivitettävää.
- Finna-APIa käyttävät e-palvelut saatiin toimimaan katkon jälkeen, kun pyysimme yhteyksien avaamista.

Toimipisteiden ja kohderyhmäfasetin mappauksaulukoissa oli päivitettävää.

Muita mainitsemisen arvoisia asioita

- Asiakkaat, joiden varaukset olivat jäädytettynä konversion aikana, eivät aluksi pystyneet muokkaamaan niitä Finnassa. Ongelma johtui tavasta, jolla Aurora käsitteli varausten keskeytyksiä ja saatiin korjattua jälkijona Kohan puolella.
- Monet Kohassa määritettävät kuvaukset (esim. erikoistilojen nimet) näkyvät Finnassa sellaisenaan, mikä on helpottanut työtä.
- Meillä Finnassa näkyminen huomioitiin jo konversiota suunnitellessa. Esim. hyllytarkenteita ei otettu käyttöön, vaan sen sijaan Auroran genre- ja sijaintikentistä siirrettiin tietoja Kohan yleiseen huomautuskenttään, joka näkyy myös asiakkaille. Lopputuloksena meillä on oikein toimiva verkkokirjasto!

Kiitos!

elina.uotila@jarvenpaa.fi



Järvenpää

